



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax: 508-7520

Requisición de Materiales y/o Equipos

NUMERO	020 - 567
FECHA REQ.	23/06/2020
DEPENDENCIA	300000032 - DIRECCION GENERAL DE CARRERA DEL MINISTERIO PUBLICO

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
PBC2	1	UNI	PUERTA BLANCA/CRISTAL 0.9 X 2.1 (1 PANELES)
PUERTA COMERCIAL DE CRISTAL ALUMINIO COLOR BLANCO Y CIERRE MAGNETICO P3 (0.96 x 2.10).			
PBC1	2	UNI	PUERTA BLANCA/CRISTAL 0.8 X 2.1 (1 PANELES)
PUERTA COMERCIAL DE CRISTAL Y ALUMINIO COLOR BLANCO P2 (0.80 x 2.10).			
PBC5	1	UNI	PUERTA BLANCA/CRISTAL 0.8 X 2. (1 PANELES)
PUERTA COMERCIAL DE CRISTAL ALUMINIO COLOR BLANCO P4 (0.80 x 2.14).			
PTA PLM	3	UNI	PUERTA DE POLIMETAL 0.80 X 2.10 MTS
POLIMETAL P5 (0.70 x 2.10).			
VENTACO	27	UNI	VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO Y ALUMINIO
VENTANAS CORREDIZA DE CRISTAL EN ALUMINIO COLOR BLANCO, CANTIDAD P2: 27.89			
DPF	2	UNI	DESMONTE DE PUERTA FLOTANTE
SERVICIO DE DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE PUERTAS DE LA COCINA Y DEL DPTO. DE PSICOLOGÍA.			
SERV-REP	1	UNI	REPARACIONES EN GENERAL
SERVICIO: CORTE Y REPARACIÓN DE HIERRO.			
GABICO	1	UNI	GABINETE DE COCINA CON PUERTAS Y GAVETAS
GABINETE DE PISO PARA LA COCINA EN PINO TRATADO, MEDIDA P2: 18.04			
GABI	1	UNI	GABINETE AEREO W800 X D350 X H400 C/GRIS
GABINETE AEREO DE COCINA, EN PINO TRATADO, MEDIDA P2: 18.04			
PPM	1	UNI	PUERTA DE PINO CON MARCO
PUERTA EN PINO TRATADO PARA AREA DE ARCHIVO EN LA OFICINA DEL TITULAR, MEDIDA P2: 59.72			
TOGRA	1	P2	TOPE DE GRANITO
TOPE DE GRANITO NATURAL, MEDIDA M2: 1.60			

*01/7/2020 p. 0001
 Adalberto Salcedo*



JR



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520

Requisición de Materiales y/o Equipos

NUMERO	020 - 567
FECHA REQ.	23/06/2020
DEPENDENCIA	300000032 - DIRECCION GENERAL DE CARRERA DEL MINISTERIO PUBLICO

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
OBSERVACIONES			
SOLICITUD SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIONES VARIAS PARA SER UTILIZADO EN LA REDE CUACIÓN DE LA FISCALÍA COMUNITARIA DE HATO DEL YAQUE, SANTIAGO.			

Preparado por	Autorizado por
<i>Nombre:</i> MARLENNE SANTANA	<i>Nombre:</i> _____
<i>Firma:</i>	<i>Firma:</i>



Denisse Rodríguez

 24/6/

J. Rodríguez

REPUBLICA DOMINICANA
Procuraduría General de La República
"Año de la Innovación y la Competitividad"

Santo Domingo D. N.
26 de agosto del 2019

A L : LIC. JONATHAN RODRIGUEZ IMBERT.
Director General Adm. Del Ministerio Público.

VÍA : ING. JENNY MARTE *Jenny Marte*
Enc. De la Unidad de Plan de Humanización.

ASUNTO para : Informe sobre evaluación de nuevo local propuesto por el Alcalde,
Proyecto de Fiscalía en Hato del Yaque -Santiago.





ANEXO : Fotos.

Propuesto
propuesto
a J. Rodríguez
de la Unidad de Plan de Humanización
J. Rodríguez

Por esta vía me place informarle sobre la visita realizada el día 23 de agosto del 2019, a la evaluación de otro local propuesto por el Alcalde de Hato del Yaque -Santiago, para instalación una fiscalía en dicha zona.

En esta visita tuvimos la oportunidad de realizar un levantamiento en una casa de dos niveles, de la cual están ofreciendo el primer nivel, lugar donde se alojaría la fiscalía, la misma consta de un área de 92.14 m2, ubicada en la calle principal y de fácil acceso para los usuarios, la adecuación de esta ronda entre los 700 mil pesos. Tomando en cuenta que hay que construir dos baños, divisiones interiores, adecuación de parqueos, eléctricos, arreglos de piso entre otros.


Ing. Joselito Mejía Santos
Ing. Civil II

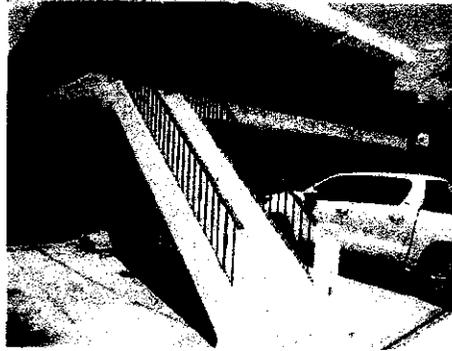


MINISTERIO PÚBLICO
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DEL PLAN DE HUMANIZACION

PRESUPUESTO NO. 000

FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

OBRA: ADECUACION DE INMOBILIARIO PARA FISCALIA (CASA DE HATO DEL YAQUE).

LOCALIZACION : PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
1.00	PRELIMINARES:					
1.01	Demoliciones y bote.	28.61	M2	120.00	3,433.20	3,433.20
2.00	MUROS					
2.01	Durock de 10cm	18.66	M2	2,450.00	45,717.00	
2.02	Sheetrock de 10cm	54.71	M2	1,050.00	57,445.50	103,162.50
3.00	TERMINACIONES					
3.01	Mochetas y dinteles de huecos para puerta	1.00	PA	3,600.00	3,600.00	
3.02	Reparacion en area de parqueos	1.00	PA	4,200.00	4,200.00	7,800.00
4.00	INSTALACIONES ELECTRICAS:					
4.01	A/A inverte de 18000 BTU	1.00	UD	0.00	0.00	
4.02	A/A inverte de 12000 BTU	5.00	UD	0.00	0.00	
4.03	Lampara de superficie 5*5 pulg led redonda. (circuito cerrado.)	20.00	UD	1,550.00	31,000.00	
4.04	Interruptor sencillo, decorativo, tubo PVC de 3/4"	18.00	UD	1,130.21	20,343.78	
4.05	Interruptor doble, decorativo, tubo PVC de 3/4"	4.00	UD	1,260.23	5,040.92	
4.06	Tomacorriente 120 volt. Ataerrizado (3 linea THW#12) tubo PVCt de 3/4"	12.00	UD	1,176.08	14,112.96	
4.07	Salida de Data y telefono, tubo PVC de 1/2" (sin cable, solo con mensajero de sogá)	15.00	UD	960.07	14,401.05	
4.08	Caja de breaker 14/28 circuito.	1.00	UD	6,500.00	6,500.00	
4.09	Breaker de 20 amp fino	8.00	UD	200.00	1,600.00	
4.10	Breaker de 30 amp fino	6.00	UD	260.00	1,560.00	
4.11	Registro 5*5 pulg plastico para empotrar	9.00	UD	80.00	720.00	
4.17	Inversol de 2k. Y 4 Bateria trojan.	1.00	UD	0.00	0.00	
4.18	Abanico KDK de pared. Para la cocina.	1.00	UD	4,850.00	4,850.00	100,128.71
5.00	PUERTA					
5.01	Comercial de cristal aluminio color blanco y cierre magnetico p3(096*2,10)	1.00	UD	22,500.00	22,500.00	
5.02	Comercial de cristal aluminio color blanco p4(0,80*2,14)	1.00	UD	12,800.00	12,800.00	
5.03	Comercial de cristal y aluminio color blanco p2(0,80*2,10)	2.00	UD	12,800.00	25,600.00	
5.04	Polimetal p5(0,70*2,10)	2.00	UD	6,500.00	13,000.00	
5.05	Ventanas corrediza de cristal en aluminio color blanco	27.89	P2	290.00	8,088.10	
5.06	Desmonte y reinstalacion de puertas, cocina y pcologia.	2.00	M2	2,200.00	4,400.00	
5.07	Corte y reparacion de hierro	1.00	PA	3,500.00	3,500.00	89,888.10
6.00	PINTURA (2 MANOS)					
6.01	Semi-gloss en int.	350.46	M2	221.00	77,451.66	
6.02	Acrilica superior en exterior	101.52	M2	181.00	18,375.12	
6.03	Acrilica superior en techo	90.00	M2	90.00	8,100.00	
6.04	Pintura de hierro en esmalte	50.00	M2	240.00	12,000.00	115,926.78



MINISTERIO PÚBLICO
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DEL PLAN DE HUMANIZACION

PRESUPUESTO NO. 000

FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

OBRA: ADECUACION DE INMOBILIARIO PARA FISCALIA (CASA DE HATO DEL YAQUE).

LOCALIZACION : PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
7.00	PISOS					
7.01	Porcelanato chino 50*50 (crema estampado) Inc, piquetear piso existente.	49.80	M2	1,460.00	72,708.00	
7.02	Zocalo en porcelanato 50*50	54.36	ML	260.00	14,133.60	86,841.60
8.00	INSTALACIONES SANITARIAS					
8.01	Inodoro corona blanco (inc. Demolcion y muñeco de instalacion)	2.00	UD	8,850.00	17,700.00	
8.02	Lavamano corona, para baños de usuarios y medico legista. (inc. Demolcion y muñeco de instalacion)	2.00	UD	6,250.00	12,500.00	
8.03	Orinal para hombre (inc. Demolcion y muñeco de instalacion)	1.00	UD	5,550.00	5,550.00	
8.04	Regilla de piso (inc. Demolcion y muñeco de instalacion)	3.00	UD	850.00	2,550.00	
8.05	Instalacion de agua potable en todas las areas	1.00	PA	3,800.00	3,800.00	
8.06	Fregadero de una boca	1.00	UD	5,020.00	5,020.00	
8.07	Trampa de grasa (inc. Conexión sanitaria)	1.00	PA	6,570.00	6,570.00	
8.08	Conexión de trampa de grasa al arrastre sanitaria	1.00	PA	2,200.00	2,200.00	
8.09	Accesorio de baño	2.00	UD	2,300.00	4,600.00	60,490.00
9.00	VARIOS					
9.01	Gabinete de piso en cocina, en pino tratado	18.04	P2	1,100.00	19,844.00	
9.02	Gabinete aereo en cocina, en pino tratado	18.04	P2	1,150.00	20,746.00	
9.03	Puerta en pino tratado, para area de archivo en oficina del titular.	59.72	P2	650.00	38,818.00	
9.04	Tope de granito natural	1.60	M2	7,200.00	11,520.00	90,928.00
10.00	LIMPIEZA FINAL:					
10.01	Limpieza final	1.00	PA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
TOTAL A CONTRATAR						RD\$660,598.89

PREPARADO POR:

ING. JOSELITO MEJIA SANTOS
UNIDAD DE HUMANIZACION

REVISADO POR:

ARQ CARLOS PEÑA
UNIDAD DE HUMANIZACION

APROBADO POR:

ING. JENNY MARTE
ENC. DE LA UNIDAD DEL PLAN DE HUNIZACION
